

**ASA de la Dyonne et du Plumion
Entretien et aménagement
Travaux 2013**



Avant : Végétation de saule fortement développée dans le lit du ru de Machéroménil créant une retenue en amont ;
Après : coupe et extraction des cépées, restauration des écoulements.



Avant : Observation d'une végétation buissonnante importante. Un travail de réouverture de ce milieu est nécessaire ;
Après : réouverture du milieu.

**ASA de la Dyonne et du Plumion
Entretien et aménagement
Travaux 2013**



Avant : Végétation buissonnante fortement développée sur le lit du ruisseau créant un frein au transit des branchages en surface du ruisseau => encombre



Après : Coupe de la végétation et restauration de l'écoulement des eaux



Avant : Nombreux encombres créant des retenues tout au long du parcours du ruisseau sur la partie amont





Après : Extraction des encombres du ruisseau

**ASA de la Dyonne et du Plumion
Entretien et aménagement
Travaux 2013**



Avant : Présence d'une souche au milieu du lit du ruisseau risquant de créer un encombre.
Chute infranchissable pour la faune piscicole ;
Après : souche éclatée permettant de restaurer la continuité sur le cours d'eau

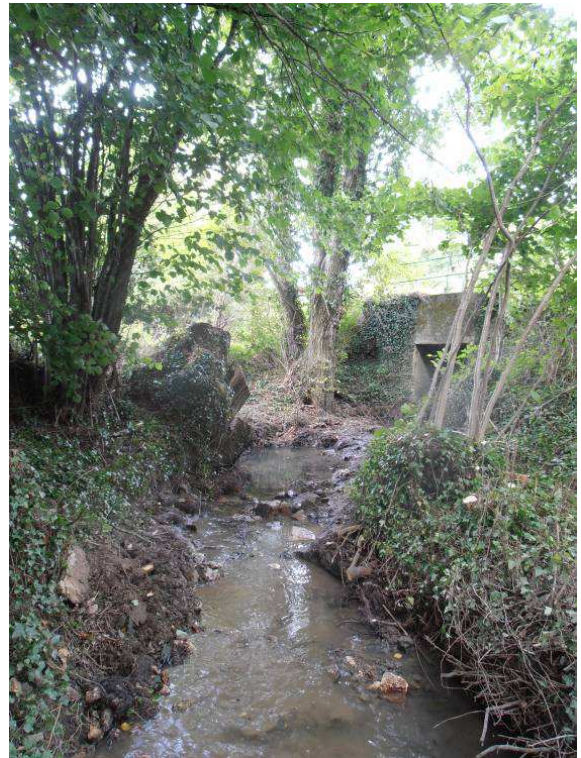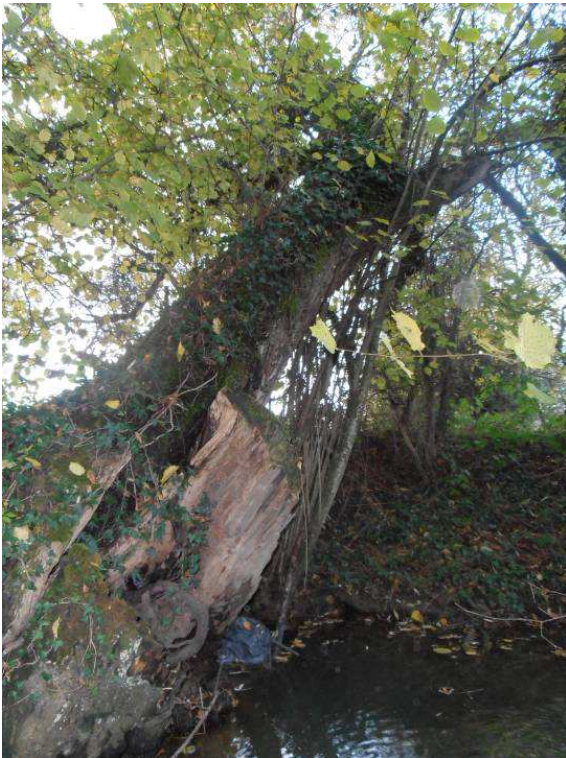

Avant : Saule éclaté au niveau de la souche, fortement incliné au dessus du ruisseau et vers la pâture ;
Après : coupe du saule, création d'un puits de lumière

**ASA de la Dyonne et du Plumion
Entretien et aménagement
Travaux 2013**



Avant : Secteur à aménager : lit du ruisseau décapé (bed-rock), relativement homogène. Absence de végétation sur une partie de la rive gauche. Réalisation d'aménagement rustique en technique végétale (peignes) et minérale (recharge sédimentaire et réalisation de déflecteurs).



Intervention : Mise en place de cailloux afin de contribuer à la recharge sédimentaire d'un secteur dépourvu de substrat.



Intervention : Réalisation d'un peigne afin de stabiliser de la berge et permettre à long terme le développement d'une banquette végétalisée
